


# Rodinný dům Na Modravě

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Náklady													2006												2007	
					VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.					
1	zahájení díla	3.8. 05	3.8. 05	1	3.8.	◆																								
2	oplocení staveniště	3.8. 05	15.9. 05	2																										
3	zařízení staveniště	5.8. 05	15.9. 05	3																										
4	zpevněná komunikace staveništní	7.8. 05	4.10. 06	4																										
5	demolice	10.8. 05	23.8. 05	5																										
6	odvodnění staveniště	15.8. 05	25.8. 05	6																										
7	Předání dokumentace	23.8. 05	23.8. 05	7																										
8	kanalizační přípojka splašková	19.9. 05	15.11. 05	8																										
9	kanalizační přípojka dešťová	19.9. 05	15.11. 05	9																										
10	vodovodní přípojka	19.9. 05	15.11. 05	10																										
11	milník č. 1 - zhotovení přípojek ZTI	15.11. 05	15.11. 05	11																										
12	zemní práce - úprava terénu, HTÚ	20.8. 05	2.10. 05	12																										
13	výkopy 1. NP	8.9. 05	15.9. 05	13																										
14	výkopy 2. NP	20.8. 05	7.9. 05	14																										
15	Předání dokumentace	9.9. 05	9.9. 05	15																										
16	Předání dokumentace	15.9. 05	15.9. 05	16																										
17	Předání dokumentace	23.9. 05	23.9. 05	17																										
18	Předání dokumentace	26.9. 05	26.9. 05	18																										
19	Předání dokumentace	7.10. 05	7.10. 05	19																										
20	1.NP spodní stavba	15.9. 05	15.11. 05	20																										
21	podkladní beton pod základy v ose "D"	15.9. 05	19.9. 05	21																										
22	izolace pod základy v ose "D"	20.9. 05	21.9. 05	22																										
23	betonování základů a stěny v ose "D"	22.9. 05	3.10. 05	23																										
24	drenáž a kanalizace pod 1.NP	19.9. 05	22.9. 05	24																										
25	podkladní beton v 1. NP	22.9. 05	26.9. 05	25																										
26	izolace proti vodě 1. NP	27.9. 05	6.10. 05	26																										
27	přebetonování izolace 1.NP	7.10. 05	9.10. 05	27																										
28	odbednění stěny v ose "D"	6.10. 05	7.10. 05	28																										
29	kanal, VZT,drenáž, zásypy -stěna"D"	7.10. 05	14.10. 05	29																										
30	kanalizace - ležatá 1. NP	12.10. 05	14.10. 05	30																										
31	betonování základů 1.NP	12.10. 05	15.11. 05	31																										
32	milník č. 2 - dokončení základ. konstr. 1.NP	15.11. 05	15.11. 05	32																										

# Rodinný dům Na Modravě

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Náklady													2006												2007	
					VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.					
33	<b>2.NP spodní stavba</b>	<b>3.10. 05</b>	<b>30.11. 05</b>	<b>33</b>																										
34	podkladní beton v 2. NP	3.10. 05	14.10. 05	34																										
35	izolace proti vodě 2. NP	17.10. 05	20.10. 05	35																										
36	přebetonování izolace 2.NP	20.10. 05	21.10. 05	36																										
37	kanalizace - ležatá 2. NP	24.10. 05	25.10. 05	37																										
38	betonování základů 2.NP	25.10. 05	30.11. 05	38																										
39	monolit ŽB - stěny, stropy 1.NP	19.10. 05	12.4. 06	39																										
40	monolit ŽB - stěny, stropy 2.NP	1.11. 05	30.4. 06	40																										
41	<b>milník č. 3 - dokončení monolit. žbk</b>	<b>30.4. 06</b>	<b>30.4. 06</b>	<b>41</b>																										
42	<i>Předání dokumentace</i>	<i>31.10. 05</i>	<i>31.10. 05</i>	<i>42</i>																										
43	<i>Předání dokumentace</i>	<i>30.11. 05</i>	<i>30.11. 05</i>	<i>43</i>																										
44	<i>Předání dokumentace</i>	<i>12.12. 05</i>	<i>12.12. 05</i>	<i>44</i>																										
45	svislé konstrukce - vyzdívky, kamen. přízdívky	13.3. 06	16.5. 06	45																										
46	izolace stavby - svislá	15.3. 06	15.5. 06	46																										
47	střešní konstrukce	1.5. 06	9.6. 06	47																										
48	úpravy povrchu, obkl., podhl.	15.5. 06	16.10. 06	48																										
49	ostatní konstrukce a práce	1.3. 06	30.10. 06	49																										
50	konstrukce tesařské	6.3. 06	15.5. 06	50																										
51	osazení cedrových kmenů	1.5. 06	15.5. 06	51																										
52	konstrukce truhlářské,parkety,rošty	22.5. 06	12.11. 06	52																										
53	konstrukce zámečnické, OK	16.9. 05	10.7. 06	53																										
54	kamenná dlažba	8.6. 06	31.8. 06	54																										
55	malby, nátěry	18.9. 06	16.11. 06	55																										
56	fasáda - kámen	1.6. 06	30.7. 06	56																										
57	fasáda - dřevo	1.7. 06	30.8. 06	57																										
58	fasáda - sklo	1.8. 06	15.9. 06	58																										
59	<b>milník č. 4 - dokončení fasády</b>	<b>15.9. 06</b>	<b>15.9. 06</b>	<b>59</b>																										
60	ZTI	19.4. 06	19.11. 06	60																										
61	montáž zařizovacích předmětů	1.11. 06	20.11. 06	61																										
62	ÚT	1.5. 06	26.11. 06	62																										
63	vrty, tepelné čerpadlo	10.4. 06	28.5. 06	63																										
64	VZT	24.4. 06	19.11. 06	64																										

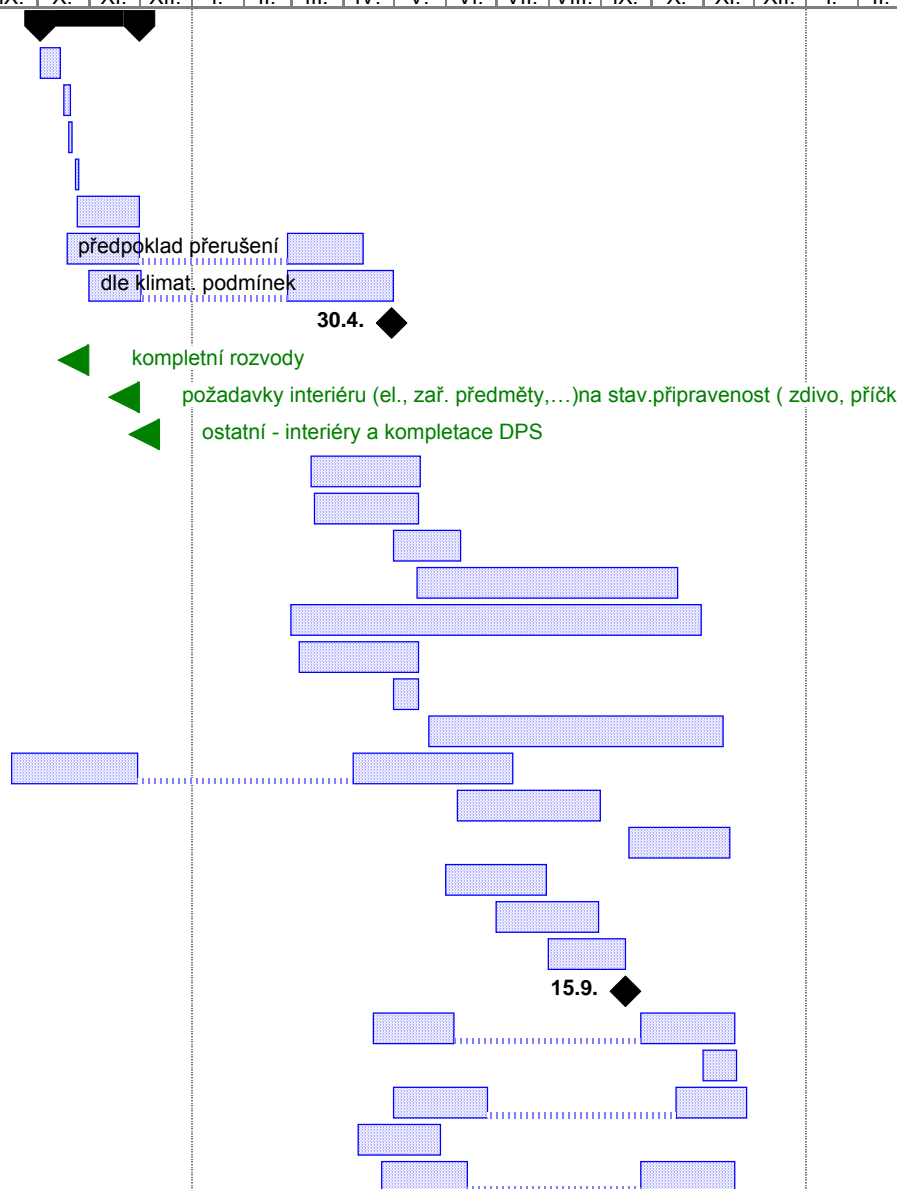

# Rodinný dům Na Modravě

ID	Název úkolu	Zahájení	Dokončení	Náklady	2006												2007								
					VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	I.	II.
65	el. instalace	14.4. 06	20.11. 06	65																					
66	slaboproud	15.4. 06	12.11. 06	66																					
67	montáž světel, kompletace elektro	15.10. 06	20.11. 06	67																					
68	satelitní stožáry	1.5. 06	12.6. 06	68																					
69	satelitní přípojka	1.6. 06	1.7. 06	69																					
70	elektro přípojka	16.6. 06	12.8. 06	70																					
71	příjezdová komunikace	1.6. 06	31.8. 06	71																					
72	ČTÚ, sadové úpravy	1.9. 06	15.10. 06	72																					
73	DSP, dokladová část	4.11. 06	24.11. 06	73																					
74	dokončovací práce uvnitř objektu, úklid	20.10. 06	8.12. 06	74																					
75	dokončení díla	10.1. 07	10.1. 07	75																					

10.1. ◆
